

令和 8 年度 上野最終処分場の維持管理状況

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
種 類	埋立ごみ	埋立ごみ	埋立ごみ	埋立ごみ	埋立ごみ								
数量(t)	539.80	463.28	320.88	427.26	350.96								2,102.18

2 定期点検に関する事項

対象	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	主な点検項目
擁壁等（えん堤）	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日								・形状の目視確認 ・覆土の崩れ、流出 ・ごみの露出
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好								
遮水工	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日								・シートの破損、亀裂・シート保護の状況 ・突起物の排除
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好								
調整槽	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日								・躯体の目視確認 ・点検歩廊の状況 ・流入管部の状況
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好								
浸出液処理設備	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日								・計装設備 ・脱水設備 ・他電気、機械設備
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好								
浸出液処理設備に設けられた導水管又は配管	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日								・亀裂、破損の有無 ・沈下、目詰まり
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好								
是正措置月日及び是正内容		措置不要	措置不要	措置不要	措置不要	措置不要								

3 水質検査に関する事項（一月に一回以上測定する項目）

対象 （採取場所）	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水※ （地下水集排水設備 上流側）	採取日	—	4月17日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日							
	結果の得られた月日	—	5月14日	6月15日	7月14日	8月27日	9月14日							
	電気伝導率(mS/m)	—	58	53	58	55	55							
	塩化物イオン(mg/ℓ)	—	18	23	21	17	16							
地下水※ （地下水集排水設備 下流側）	採取日	—	4月17日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日							
	結果の得られた月日	—	5月14日	6月15日	7月14日	8月27日	9月14日							
	電気伝導率(mS/m)	—	53	48	59	59	58							
	塩化物イオン(mg/ℓ)	—	26	25	30	35	39							
放流水 （放流ビット）	採取日	—	4月17日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日							
	結果の得られた月日	—	5月14日	6月15日	7月14日	8月27日	9月14日							
	pH（水素イオン濃度）	5.8～8.6	7.5	7.8	7.8	7.2	7.8							
	生物化学的酸素要求量(mg/ℓ)	20以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0							
	化学的酸素要求量(mg/ℓ)	20以下	1.9	1.3	2.1	1.3	2.1							
	浮遊物質(mg/ℓ)	10以下	8.8	10	9.7	10	7.5							
是正措置月日及び是正内容			措置不要	措置不要	措置不要	措置不要	措置不要							


※ 別紙「上野最終処分場における地下水集排水設備からの地下水の採取位置図」参照

4 水質検査に関する事項（一年に一回以上測定する項目）

対象（採取場所）			放流水（放流ピット）	対象（採取場所）			地下水 [*] （地下水集排水設備 下流側）
採取月日			7月17日	採取月日			7月17日
結果の得られた月日			8月27日	結果の得られた月日			8月27日
項目	基準値	測定結果		項目	基準値	測定結果	
アルキル水銀化合物 (mg/ℓ)	検出されないこと	<0.0005		アルキル水銀化合物 (mg/ℓ)	検出されないこと	<0.0005	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/ℓ)	0.005以下	<0.0005		水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/ℓ)	0.0005以下	<0.0005	
カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	0.03以下	<0.003		カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	0.003以下	<0.0003	
鉛及びその化合物 (mg/ℓ)	0.1以下	<0.01		鉛及びその化合物 (mg/ℓ)	0.01以下	<0.005	
有機リン化合物 (mg/ℓ)	1以下	<0.1		六価クロム化合物 (mg/ℓ)	0.02以下	<0.002	
六価クロム化合物 (mg/ℓ)	0.2以下	<0.02		砒素及びその化合物 (mg/ℓ)	0.01以下	<0.001	
砒素及びその化合物 (mg/ℓ)	0.1以下	<0.01		シアン化合物 (mg/ℓ)	検出されないこと	<0.1	
シアン化合物 (mg/ℓ)	1以下	<0.1		ポリ塩化ビフェニル (PCB) (mg/ℓ)	検出されないこと	<0.0005	
ポリ塩化ビフェニル (PCB) (mg/ℓ)	0.003以下	<0.0005		トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01以下	<0.001	
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.1以下	<0.001		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01以下	<0.001	
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.1以下	<0.001		ジクロロメタン (mg/ℓ)	0.02以下	<0.001	
ジクロロメタン (mg/ℓ)	0.2以下	<0.002		四塩化炭素 (mg/ℓ)	0.002以下	<0.0002	
四塩化炭素 (mg/ℓ)	0.02以下	<0.0002		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	0.004以下	<0.0004	
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	0.04以下	<0.0004		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.1以下	<0.001	
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	1以下	<0.001		1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.04以下	<0.004	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.4以下	<0.002		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	1以下	<0.001	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	3以下	<0.001		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.006以下	<0.0006	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.06以下	<0.006		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	0.002以下	<0.0002	
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	0.02以下	<0.002		チウラム (mg/ℓ)	0.006以下	<0.0006	
チウラム (mg/ℓ)	0.06以下	<0.006		シマジン (mg/ℓ)	0.003以下	<0.0003	
シマジン (mg/ℓ)	0.03以下	<0.003		チオベンカルブ (mg/ℓ)	0.02以下	<0.002	
チオベンカルブ (mg/ℓ)	0.2以下	<0.02		ベンゼン (mg/ℓ)	0.01以下	<0.001	
ベンゼン (mg/ℓ)	0.1以下	<0.01		セレン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.01以下	<0.001	
セレン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.1以下	<0.01		1,4-ジオキサン	0.05以下	<0.005	
1,4-ジオキサン (mg/ℓ)	0.5以下	<0.005		クロロエチレン	0.002以下	<0.0002	
ほう素及びその化合物 (mg/ℓ)	50以下	0.9		ダイオキシン類 (pg-TEQ/ℓ)	1以下	0.061	
ふっ素及びその化合物 (mg/ℓ)	15以下	<0.8		※ 別紙「上野最終処分場における地下水集排水設備からの地下水の採取位置図」参照			
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg)	200以下	13					
n-ヘキサン抽出物質（鉱油） (mg/ℓ)	5以下	<1.0					
n-ヘキサン抽出物質（動植物油脂類） (mg/ℓ)	30以下	<1.0					
フェノール類含有量 (mg/ℓ)	5以下	<0.5					
銅含有量 (mg/ℓ)	3以下	<0.05					
亜鉛含有量 (mg/ℓ)	2以下	0.01					
溶解性鉄含有量 (mg/ℓ)	10以下	0.06					
溶解性マンガン含有量 (mg/ℓ)	10以下	0.05					
クロム含有量 (mg/ℓ)	2以下	<0.05					
大腸菌数（コロニー形成単位/㎖ℓ）	800以下	0					
有機含有量（T-P）	-	1.1					
ダイオキシン類 (pg-TEQ/ℓ)	10以下	0					

5 残余の埋立容量に関する測定（一年に一回以上測定する項目）

測定月日	総埋立容量（m3）	埋立量 (m3)	残余の埋立量 (m3)
	506,471		506,471

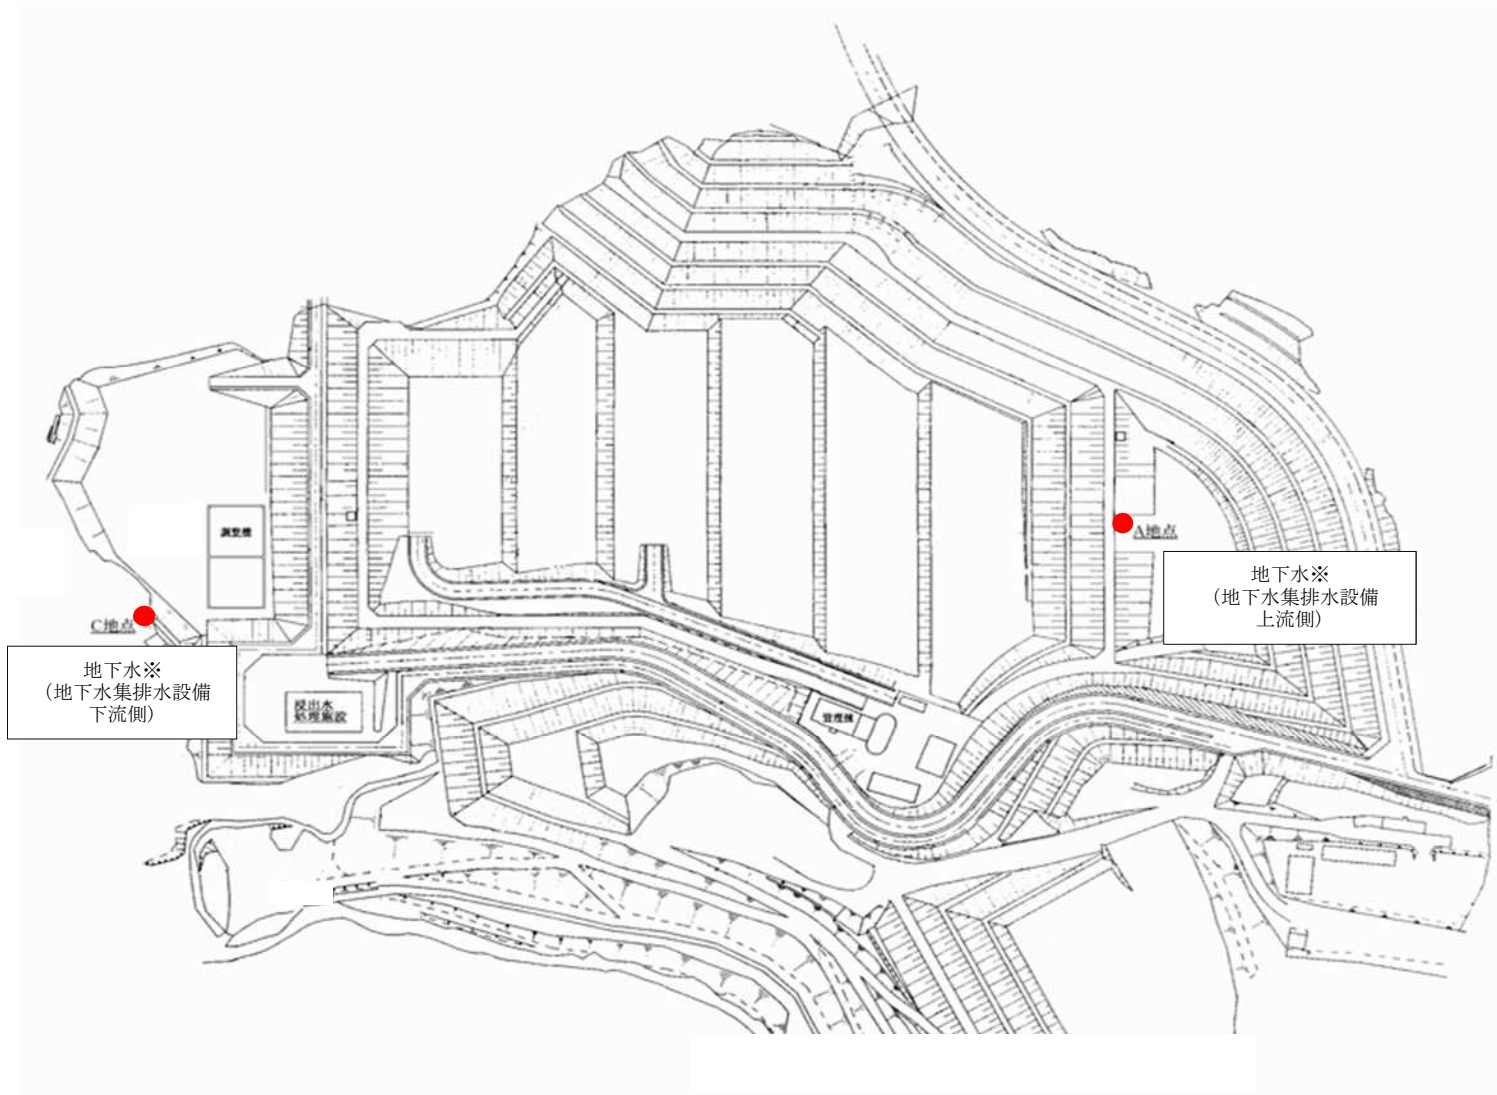

上野最終処分場における地下水集排水設備からの地下水の採取位置図
